

PORT DE LA GARE, PARIS 13^{ème}

Travaux de réparation du quai maçonné



Maître d'ouvrage

HAROPA PORT | Paris

Direction de l'Aménagement

1 quai de Grenelle – 75015 Paris

Tél : 06.69.51.38.83



Maître d'œuvre

HAROPA PORT | Paris

Direction de l'Équipement et de l'Ingénierie

1 quai de Grenelle – 75015 Paris

Tél : 06.32.96.05.41



Coordonnateur SPS

COSSEC groupe DEGOUY

16 rue de la Maison Rouge - 77185 Lognes

Tél : 06.82.81.44.55



AMO Environnement

ESSOR Ingénierie

10 rue de Rome - 75008 Paris

Tél : 06.72.13.95.16



Entreprise

Océlian

12 - 14 rue Louis Blériot - 92500 RUEIL MALMAISON

Tél : 01 57 98 83 77



Procédure de mis en sécurité en cas de crue

Date	Indice	Objet	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur
16/09/2025	0	1 ^{ère} diffusion	GDL	JLO	RBT
31/10/2025	1	2 ^{ème} Diffusion	GDL	JLO	RBT

Affaire	Phase	Émetteur	Domaine	Type doc	N° document	Indice	Page
25-081	EXE	OCELIAN		PE	304	1	0

TRAVAUX DE REPARATION DU QUAI MAÇONNÉ SUR LE PORT DE LA GARE, PARIS 13ème

Procédure de mise en sécurité en cas de crue

Procédure d’Exécution

(VCMF PE00/V02)

Indice	Date	Rédacteur *	Vérificateur *	Approbateur *	Modifications - Observations
0	16/09/2025	GDL	JLO	RBT	1 ^{ère} diffusion
1	31/10/2025	GDL	JLO	RBT	2 ^{ème} diffusion

PRÉSENTATION DE LA PROCÉDURE AUX ÉQUIPES

Nom	Entreprise	Signature	Nom	Entreprise	Signature

Procédure d'exécution – Remplacement de maçonnerie.

SOMMAIRE

1.	OBJET	5
2.	DOMAINE D'APPLICATION.....	5
3.	DOCUMENT DE REFERENCE	5
4.	Contexte	5
5.	MOYENS.....	7
5.1.	Personnel	7
5.2.	Matériels	8
6.	MODE OPERATOIRE Remplacement / réparation de pierre / moellons	8
6.1.	Définition des débits.....	8
6.2.	Dispositif d'astreinte.....	9
6.3.	Installation démontable en cas de crue	9
6.3.1.	En situation normale	9
6.3.2.	En situation de vigilance (débit instantané = 700 m3/s - +28.80 NGF).....	9
6.3.2.1.	La sécurité des ateliers fluviaux.....	9
6.3.2.2.	La sécurisation du matériel à terre	9
6.3.3.	En situation d'arrêt (Debit instantané = 920 m3/s - +29 NGF).....	10
7.	Plan de contrôle.....	10
8.	Maître des risques environnementaux.....	10
9.	Analyse de risques.....	11

Cette procédure constitue un additif au PPSPS et au PAQE



RAPPEL DES CONSIGNES DE SECURITE

- Chute à l'eau : port du gilet **obligatoire** ;
- Chute de plain-pied : laisser des passages de circulation suffisants ;
- Pincement ou écrasement : utiliser des pinces réglementaires, le port des chaussures de sécurité et gants **obligatoires** ;
- Projection de solides ou liquides : port du casque et des lunettes de sécurité **obligatoire** ;
- En cas de nuisance sonore : port de protections auditives **obligatoire**.

1. OBJET

Cette procédure a pour but de décrire la réalisation de la mise en procédure de repli d'urgence en cas de crue.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Cette procédure concerne les ouvrages réalisés à partir d'un ponton et en terrestre.

3. DOCUMENT DE REFERENCE

Se référer aux documents du marché (CCTP, plans d'exécutions, etc.).

4. Contexte

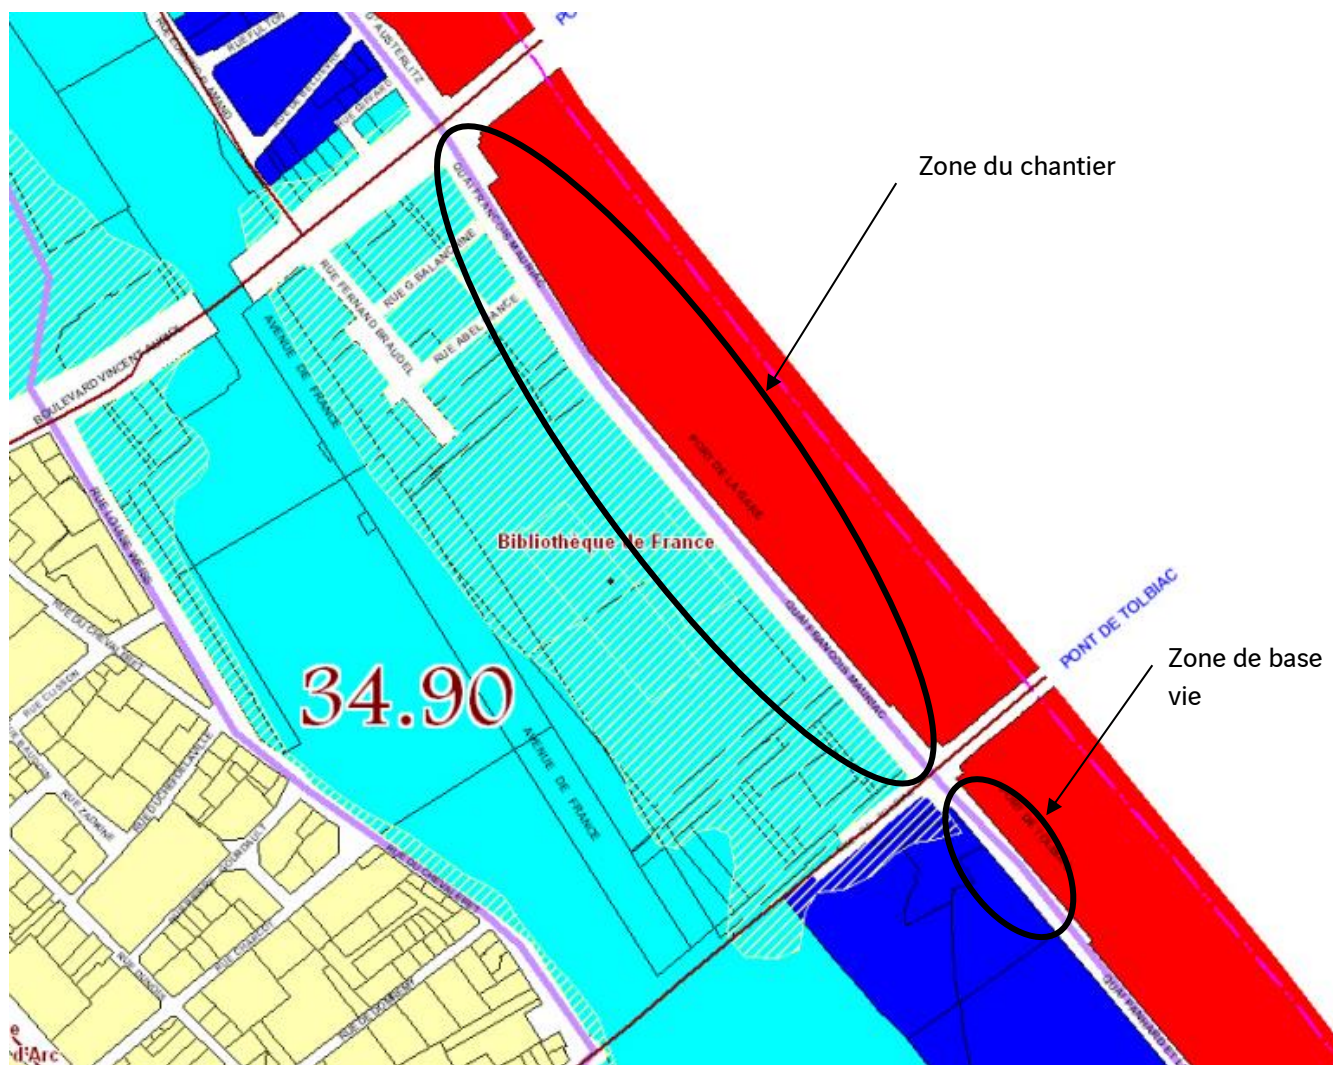


Figure 1 : Plan de prévention des risques d'inondation du Port de la Gare

Définition de l'ilot = Parcellaire APUR 2000

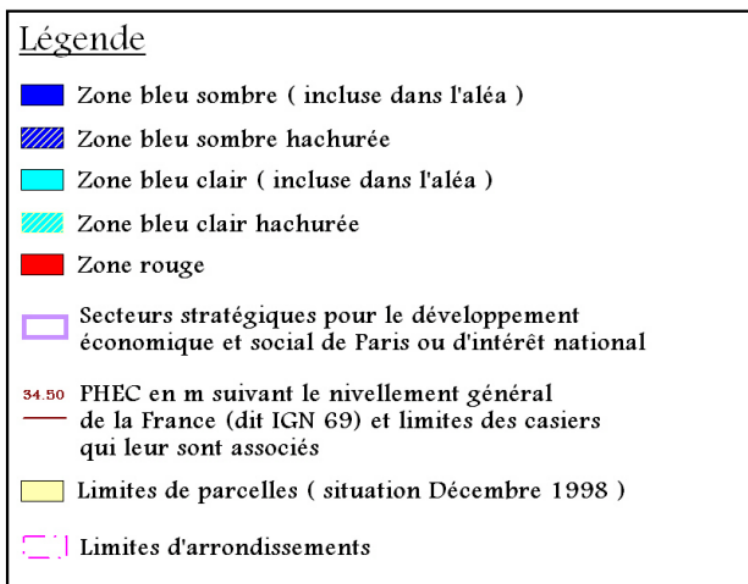


Figure 2 : Légende du plan de prévention des risques d'inondation du Port de la Gare

Dans le contexte du PPRI de lu Port de la Gare, Paris 13^{ème}, nous constatons que les 2 zones de chantier (base vie + travaux) se situent dans la zone dite « rouge » du plan de prévention.

Ceci induit :

Lorsque le stockage de produits polluants ou dangereux ou l'activité d'installations classées sont en rapport avec les activités liées à la zone marron, toutes dispositions visant à éviter une pollution des eaux du fleuve en crue par ces produits ou activités devront être prises.

L'occupation du fleuve ne doit pas avoir pour effet d'aggraver directement ou indirectement les risques pendant la crue. L'ancrage et l'amarrage des bâtiments, établissements et matériels flottants doivent être adaptés aux contraintes de crues jusqu'aux plus hautes eaux connues.

5. MOYENS

5.1. Personnel

Le personnel présenté ci-dessous, est le personnel qui sera présent sur le chantier pendant le pic d'activité. Le personnel aidera pour effectuer le plus rapidement possible le repli du chantier en cas de crue.

- Conducteur d'engins
- Chef d'équipe
- Ouvriers
- Conducteur de travaux

5.2. Matériels

Le matériel qui sera utilisé pour effectuer le repli du chantier sera :

- Grue mobile de 50T ou camion bras grue
- 1 Pousseur

Le matériel qui sera sur place pendant les travaux sont :

- 1 Ponton
- 1 Pelle à chenilles en caoutchouc 10 T
- BRH
- Barrières Heras
- 1 Container

6. MODE OPERATOIRE Remplacement / réparation de pierre / moellons

6.1. Définition des débits

Les débit maximums journaliers estimés des crues, sur la période de travaux, sur la base des données de la station d'Austerlitz sont

	Etiage	Débit moyen	Débit seuil de vigilance	Débit seuil d'arrêt
Débits (m3/2)	100	339	700 m3/s	920 m
Correspondance e code couleur Vigicrue	Vert : Pas de vigilance particulière requise	Jaune : Risque de crue génératrice de débordements	Rouge : Risque de crue majeure ?	

Niveaux

	Niveau amont (NGF)	Niveau aval (NGF)
Etiage	+25.92	-
Retenue Normale	+26.72	-
PHEN	+30.37	+30.27
Crue 1910	+34.94	+34.80
Seuil d'alerte chantier	+28.80	-
Seuil d'arrêt de chantier	+29.00	-
Débit 660 m3/s	+28.55	+28.48

6.2. Dispositif d'astreinte

L'entreprise Océlian mettra en place dès le démarrage des travaux, un dispositif d'astreinte, afin de surveiller les débits de la Seine, et de procéder au repli du personnel et du matériel en cas de crue. Une analyse sera faite en temps réel, et ce 24h/24, sur le site VIGICRUE (station Austerlitz). Les deux personnes désignées et joignables afin de gérer ces situations d'urgence sont :

- Gabriela DA LUZ (Conductrice de travaux) : 06.23.88.63.34
- Vincent BILLON (Conducteur de travaux) : 07.77.88.01.09

6.3. Installation démontable en cas de crue

L'ensembles des installations constituant la base vie et de stockages terrestre devront être démontées ou mises en sécurité en cas de crue. Les différentes installations sont détaillées ci-dessous :

6.3.1. En situation normale

Tout au long de la durée du chantier, une vigilance particulière sera portée sur les variations du niveau d'eau amont afin d'anticiper une crue éventuelle. Le conducteur travaux et le chef de chantier en charge des travaux feront une veille journalière sur Vigicrues (station d'Austerlitz) en dehors de la période d'étiage.
<https://www.vigicrues.gouv.fr>

6.3.2. En situation de vigilance (débit instantané = 700 m³/s - +28.80 NGF)

Dans cette situation de vigilance, un suivi horaire des débits sera réalisé sous forme de fiche de contrôle. Dans le cas où nous rencontrons des débits supérieurs à 700m³/s, le groupement se mettra en situation de pouvoir réaliser en 24 heures la sécurisation des ateliers fluviaux et du matériel à terre.

6.3.2.1. La sécurité des ateliers fluviaux

Les précautions suivantes seront prises :
Les ateliers fluviaux présents sur le chantier posséderont tous des pieux gravitaires ou hydrauliques.
Les pieux permettront de mettre en sécurité les pontons lors d'une crue.

6.3.2.2. La sécurisation du matériel à terre

- Barrières de chantier

Procédure d'exécution – Remplacement de maçonnerie.

- Containers
- Bennes à déchets
- Les véhicules stationnés
- Engins de chantier
- Matériels divers de chantier

De manière générale, tout matériel ou matériau susceptible de limiter l'expansion des crues ou d'être susceptible d'être emmené par la Seine.

6.3.3. En situation d'arrêt (Débit instantané = 920 m³/s - +29 NGF)

Dans le cas d'un débit supérieur ou égal à 920 m³/s, l'entreprise mettra tout en œuvre pour retirer les installations de chantier terrestres « démontables » après validation par le Maître d'Œuvre, sous un délai de 24h. Ce seuil d'alerte concerne les travaux terrestre et travaux sous eau.

Les installations seront évacuées vers le Dépôt Foselev à Villeparisis

La benne à déchet sera évacuée par la société STLG

Les contenants des déchets dangereux seront eux évacués et stocker sur nos dépôts.

Les ateliers fluviaux seront mis en sécurité, à l'aide du pousseur présent en permanence sur site.

7. Plan de contrôle

Nature du contrôle	Mode de contrôle	Responsable	Objectif / tolérance	AC	Fréquence	PC	PA	Support
Contrôle								
Suivi des débits de la Seine	Visuel / site internet vigicrue	Conducteur de travaux / Chef de chantier	Respect des seuils de vigilance et d'arrêt	x	Quotidienne	x	x	Site internet vigicrue

8. Maître des risques environnementaux

Aspect / Impact environnementale significatif	Mesures préventives à prendre sur site	Méthode utilisée Matériel / Fourniture	Responsable du contrôle	Fiche d'enregistrement
Ecoulement de l'eau	Dresser une liste du matériel qui doit être retiré de la zone d'écoulement de la Seine	Evacuation du matériel	Chef de chantier	Voir liste du matériel

9. Analyse de risques

Activité	Risques prévisibles	Mesures de prévention
Accès au poste de travail	Chute de hauteur	Les échelles, passerelles pourront être utilisés comme moyens d'accès au poste de travail, dans les conditions définies dans le code du travail.
	Chute à l'eau, noyade	Des gilets de sauvetage sont mis à disposition pour le personnel prenant les moyens nautiques.
Conduite de véhicules et engins sur chantier	- Basculement, renversement - Bruit - Collision - Vibrations mécaniques - Heurt	- Mode opératoire défini par les chantiers - Formation au CACES de notre personnel en fonction des engins utilisés - Délivrance d'un titre d'autorisation - Personnel de l'entreprise équipé de protections auditives moulées - Fourniture de bouchons d'oreilles sur le chantier - Utilisation de matériel en bon état et conforme à la réglementation
Circulation de personnes dans une zone de véhicules et engins	- Heurts, - Ecrasement	- Balisage des cheminements piétons - Rédaction d'un plan de circulation et présentation aux personnels - Identifier un homme trafic si nécessaire - Obligation d'avoir un Bip de recul/cri du lynx et de caméras de recul
Travaux sur ou à proximité de sites maritimes et fluviaux	- Noyade - Collision avec/entre engins flottants	- Présence de bouées, couronnes et lignes de jet de 30m - Port de gilet de sauvetage obligatoire - Vérification des gilets de sauvetage annuellement par une entreprise agréée - Formation / sensibilisation sur le risque aquatique - Personnel navigant formé - Matériel conforme - Utilisation de moyens de communication pour alerter les autres usagers de la voie navigable - Respect de la signalisation (éclairage et panneaux réglementaires) - Sensibilisation sur la/les procédure(s) d'urgence

Activité	Risques prévisibles	Mesures de prévention
Navigation	- Collision - Noyade	- Port du gilet de sauvetage avec sous cutale - VHF et prévenance avant navigation - Vérifier le bon fonctionnement du moteur - Relever le moteur après utilisation - Bon amarrage du bateau
Embarquement / débarquement	- Chute à l'eau - Noyade	- Port du gilet de sauvetage obligatoire - Passerelle d'accès et/ou échelle fixe
Travaux ou circulation dans une zone de masses mises en mouvement volontaire (levage, manutention...) ou accidentel	- Chute d'objets - Heurt/écrasement	- Vérification des points d'élingage / d'ancrage - Accessoires de levage contrôlés et vérifiés - Matériel conforme et vérifié - Balisage de la zone - Pas de personnel sous la charge - Stocker les objets de manière sécurisée - Matériels utilisés par du personnel ayant obtenu les CACES et ayant été autorisé par l'employeur - Formation du personnel à l'élingage / chef de manœuvre - Ne pas accéder à la zone de survol de la grue
Utilisation d'appareils de levage de charges	- Renversement/basculement - Chute de la charge - Heurt/écrasement	- Matériels utilisés par du personnel ayant passé les CACES et ayant été autorisé par l'employeur - Formation du personnel à l'élingage - Etude de stabilité - Adéquation de levage - Personnels formés à l'élingage - Accessoires de levage contrôlés et vérifiés - Balisage de la zone - Chef de manœuvre formé, désigné et identifié par un gilet vert - Respect des ordres émis par le chef de manœuvre et le grutier - Guidage par radio - Mise en sécurité du personnel lors des opérations de levage - Calage des matériaux et matériels transportés - Port des EPI obligatoire

Procédure d'exécution – Remplacement de maçonnerie.

Activité	Risques prévisibles	Mesures de prévention
Raccordement électrique installations/bases-vies	• Electrocutation	• Habilitation électrique suivant l'installation - à vérifier/définir • EPI spécifiques à la manipulation / aux travaux électriques • Vérification de l'installation électrique par un organisme agréé (à minima 1 fois par an)
Raccordement / repli des installations sanitaires / eaux usées	• Hygiène • Sanitaire / maladie / bactériologique	• Port des EPI adéquats (gants, masques, lunettes, vêtements...) • Matériels de désinfection

