

PORT DE LA GARE, PARIS 13^{ème}

Travaux de réparation du quai maçonné



Maître d'ouvrage

HAROPA PORT | Paris

Direction de l'Aménagement

1 quai de Grenelle – 75015 Paris

Tél : 06.69.51.38.83



Maître d'œuvre

HAROPA PORT | Paris

Direction de l'Équipement et de l'Ingénierie

1 quai de Grenelle – 75015 Paris

Tél : 06.32.96.05.41



Coordonnateur SPS

COSSEC groupe DEGOUY

16 rue de la Maison Rouge - 77185 Lognes

Tél : 06.82.81.44.55



AMO Environnement

ESSOR Ingénierie

10 rue de Rome - 75008 Paris

Tél : 06.72.13.95.16



Entreprise

Océlian

12 - 14 rue Louis Blériot - 92500 RUEIL MALMAISON

Tél : 01 57 98 83 77



PAQE

Date	Indice	Objet			Rédacteur	Vérificateur	Approbateur	
22/09/2025	0	1 ^{ère} Diffusion			GDL	JLO	RBT	
Affaire	Phase	Émetteur	Domaine	Type doc		N° document	Indice	Page
25-081	EXE	OCELIAN		QHSE		201	0	0



P.A.Q.E

Affaire :
Travaux de réparation du quai maçonné, Port de la Gare Paris 13ème

Indice	Date	Rédacteur *	Vérificateur *	Approbateur *	Modifications - Observations
0	19/09/2025	GDL	J LO	RBT	1ère diffusion

- * Rédacteur : toute personne compétente
- * Vérificateur : personne compétente différente du rédacteur, vérifie le contenu technique
- * Approbateur : personne différente du rédacteur, approuve le contenu technique et donne son accord pour l'application du document

PRESENTATION DU PAQE – EMARGEMENT

Intervenant	Fonction	Signature



SOMMAIRE

PRESENTATION DU PAQE – EMARGEMENT.....	2
A. PRESENTATION DES PRESTATIONS ET DES INTERVENANTS	6
1. Objet du marché.....	6
1.1. Chantier.....	6
1.1.1. Coordonnées chantier.....	6
1.1.2. Accès et conditions d'accès – Parking	6
1.2. Description sommaire des travaux	6
1.3. Délais d'exécution prévisionnels (selon planning des travaux).....	6
2. Intervenants.....	7
2.1. Maitre d'Ouvrage	7
2.2. Maitre d'Œuvre	7
2.3. Entreprise principale – Groupement	7
2.4. Travaux sous-traités.....	7
3. Organisation du chantier	8
3.1. Organigramme	8
3.2. Effectifs prévus sur le chantier.....	8
3.3. Matériels spécifiques prévus.....	9
3.4. Principaux fournisseurs	10
3.5. Bureau d'études et bureau des méthodes.....	10
3.6. Laboratoires et organismes de contrôle	10
3.7. Structure prévention du chantier	11
3.8. Horaires du chantier.....	11
B. DISPOSITIONS D'ASSURANCE DE LA QUALITE ET DE L'ENVIRONNEMENT	11
1. Système de Management de la Qualité du chantier	11
1.1. Maitrise des documents.....	12
1.1.1. Documents contractuels.....	12
1.1.2. Documents émis par l'Entreprise	12
1.1.3. Gestion des documents de chantier	13
1.1.4. Modification des documents	13
1.2. Maitrise des enregistrements	13
2. Contrôles (ISO 9 001 §8.2.4).....	14
3. Maitrises des Ouvrages Provisoires.....	15

4. Propriété des clients ou des prestataires externes (ISO 9 001 §8.5.3)	15
5. Maitrise des équipements de Surveillance et Mesure (ISO 9 001 § 9.1)	15
6. Maitrise du produit non-conforme (ISO 9 001 §10.2)	16
7. Actions correctives et préventives (ISO 9 001 §10.2)	17
7.1. Action Corrective	17
7.2. Action Préventive	18
8. Demande de Clarification, Modification ou Dérogation	18
9. Formation	18
10. Système de Management Environnemental	18
10.1. Missions et Responsabilités	18
10.2. Sensibilisation du personnel à l'Environnement	18
10.3. Autres intervenants sur le chantier	19
10.4. Organisation du Respect de l'Environnement	19
10.4.1. Politique Environnementale	19
10.4.2. Sensibilité du site	20
10.4.3. Cadre Réglementaire Environnemental	21
10.4.3.1. Loi sur l'Eau	21
10.5. Schéma d'élimination des déchets	25
10.5.1. Déchets produits par le chantier	25
10.5.2. Collecte, Conditionnement, Tri	26
10.5.3. Filières d'élimination	27
10.5.4. Suivi et traçabilité	27
10.5.5. Synoptique du suivi des déchets	27
ANNEXES	30
Annexe 1 : Engagement de la Direction de chantier	31
Annexe 2 : Liste des procédures d'exécution	32
Annexe 3 : Liste des opérations de contrôle	33
Annexe 4 : Situation(s) d'urgence Environnement	34
Annexe 5 : Liste des produits dangereux	36
Annexe 6 : Affichage Environnement du chantier	38
Annexe 7 : Plan d'action Respect des prescriptions Loi sur l'Eau ou ICPE	40

A. PRESENTATION DES PRESTATIONS ET DES INTERVENANTS

1. Objet du marché

1.1. Chantier

1.1.1. Coordonnées chantier

Adresse : Port de la Gare 75013 PARIS

1.1.2. Accès et conditions d'accès – Parking

- Moyens d'accès :
 - Par la route Accès par le quai Panhard et Levassor
 - Par le bus Ligne 25 / 325 arrêt Thomas Mann
 - Par le train RER C et Métro ligne 14 arrêt Bercy
- Transport du personnel :
SO
- Circulation des véhicules :
 - Emplacement des parkings : parking disponible sur le base vie.

1.2. Description sommaire des travaux

Poste n° :	Désignation :
-	Curage,
-	Nettoyage des maçonneries sous eau et hors d'eau,
-	Réalignement des pierres de couronnement,
-	Rejointoiement des pierres sous eau et hors d'eau,
-	Béton immergé des cavités,
-	Réparation d'exutoires,
-	Fourniture et mise en œuvre d'anneau d'amarrage,
-	Réparation et changement des échelles,

1.3. Délais d'exécution prévisionnels (selon planning des travaux)

- Date de l'ordre de service : 02/07/2025

- Démarrage des travaux : 03/11/2025
- Délais de la partie concernant notre marché : 4 mois
- Date de livraison de l'ouvrage : 02/03/2026

2. Intervenants

2.1. Maitre d'Ouvrage

Direction de l'aménagement de Paris (HAROPA PORT – Paris)
1, quai de Grenelle
75 015 PARIS cedex 15

2.2. Maitre d'Œuvre

Direction de l'équipement et de l'ingénierie
1 quai de Grenelle
75 015 PARIS

2.3. Entreprise principale – Groupement

Coordonnées de l'entreprise

VINCI Construction Maritime et Fluvial
7 rue Ernest Flammarion
ZAC du Petit Le Roy
Chevilly Larue
94659 RUNGIS CEDEX
Tél 01 49 61 71 00 - Fax 01 49 61 71 01

Direction Nord - Ile de France - Secteur de Villeneuve le Roi - 89 rue Paul Bert - 94290 VILLENEUVE LE ROI - Tél : 01 49 61 45 30

2.4. Travaux sous-traités

L'entreprise sous-traitera les travaux suivants pour lesquels elle propose la liste non exhaustive suivante :


Nature des travaux	Sous-traitants	PAQE Oui / Non	PPSPS Oui / Non

Chaque sous-traitant précisera lors de la présentation de son dossier d'agrément les moyens en personnel et matériel qu'il compte utiliser sur le chantier.

3. Organisation du chantier

3.1. Organigramme

Sur site :

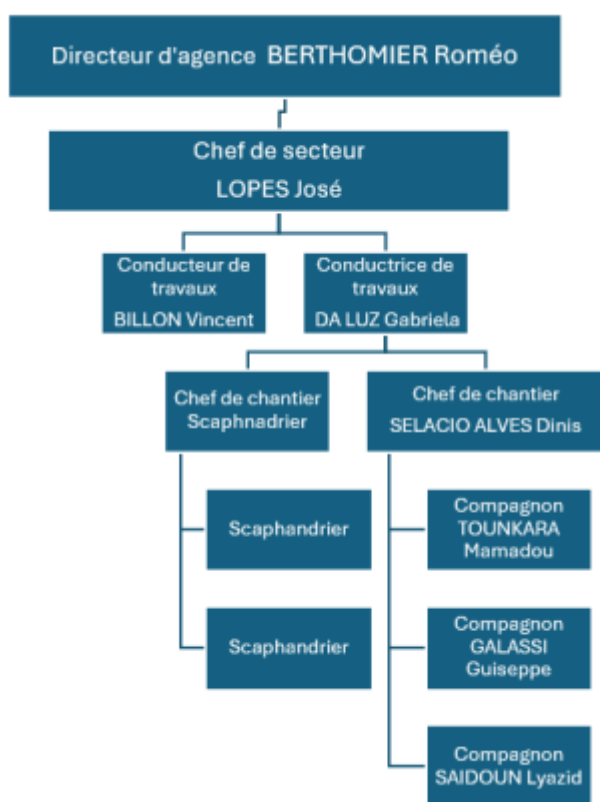

3.2. Effectifs prévus sur le chantier

Encadrement : 2 conducteurs de travaux / 1 chef d'équipe/ 1 chef de chantier scaphandrier
 Ouvriers : 1 équipe de 2 scaphandriers / 3 maçons
 Effectif total prévu en période de pointe : 9 personnes
 Sous-traitants : sans objet
 Courbe prévisionnelle des effectifs : à définir en fonction des aléas climatiques

3.3. Matériels spécifiques prévus

- Un ponton fluvial,
- Un pousseur,
- Matériel de travaux subaquatiques (compresseur, narguilhé, etc...),
- Embarcation légère motorisée,
- Pompe et lance THP 300 bars,
- Lance THP avec contre jet pour les travaux subaquatiques,
- Outillage hydraulique subaquatique,
- Camion toupie.
- Barrage anti MES
-

3.4. Principaux fournisseurs

Fournitures	Fournisseurs	Responsable de la réception
Ancrages	ADC Maritime	Ocelian – Conducteur Travaux + Chef de Chantier
Béton immergé	Cemex / EQIOM	Chef de chantier
Produit de rejointoiement des maçonnerie	Parex LANKO	Chef de chantier
Produit de rejointoiement sous eau	Epicol T	Chef de chantier
Pierre de Souppes	Carrière de Souppes	Conducteur de travaux Chef de chantier
Mortier de réparation Fibré	Parex lanko	chef de chantier
Produit de passivation des aciers lanko 760	Parex Lanko	Chef de chantier

3.5. Bureau d'études et bureau des méthodes

L'entreprise a réalisé les études d'exécution par son propre Bureau d'Etudes o

L'entreprise a réalisé les études de méthodes par son propre Bureau d'Etudes

3.6. Laboratoires et organismes de contrôle

L'entreprise fera appel aux laboratoires ou organisme suivants :

Laboratoires ou Organismes	Domaine d'intervention

3.7. Structure prévention du chantier

- Coordonnateur SPS Conception : Cossec groupe Degouv
- Coordonnateur SPS Réalisation : Cossec groupe Degouv
- Le CISSCT (Collège Interentreprises Santé Sécurité Conditions de Travail), s'il existe : Représenté Mr HINTZY
- *Représentant des salariés de l'entreprise : Frantzy SOMENZI*
-
- Le chargé Prévention de l'entreprise du chantier : Jennifer BOULAROUAH

3.8. Horaires du chantier

Les horaires de travail du chantier sont :

Du lundi au jeudi : 7h30 -12h00 / 13h00 – 16h30

Vendredi : 7h30 – 12h00

Ces horaires peuvent varier suivant les impératifs du chantier.

B. DISPOSITIONS D'ASSURANCE DE LA QUALITE ET DE L'ENVIRONNEMENT

L'objet du présent document est de décrire les dispositions prises en matière d'Assurance de la Qualité et d'Environnement sur le chantier.

Les procédures d'exécution applicables à ce chantier sont annexées à ce PAQE.

La liste de ces procédures d'exécution est donnée dans la liste des documents applicables (FO56).

Le PAQE et les procédures d'exécution associées sont diffusées à :

- Maître D'œuvre
- ESSOR Ingénierie -----
- Services internes OCELIAN -----

1. Système de Management de la Qualité du chantier

Documents particuliers au marché :

Le système qualité est établi en référence aux documents contractuels suivants :

- Articles du CCAP : Article 6 – Article 8.4
- Articles du CCTP : 2.9.2 – 2.9.4 – 2.9.5 – 2.9.6 – 2.9.7 – 2.9.8 – 2.9.9 – 2.9.10 – 2.9.11 – 2.9.12 – 2.9.13 – 2.9.14 – 2.9.15 – 2.9.16 – 2.9.17 – 2.9.18 -2.9.19 – 2.9.20 – 2.9.21 – 2.9.22 – 2.9.25 –
- Autres pièces du marché :
- Entreprise qui gère le système qualité du groupement : Vinci Construction Maritime et Fluvial

1.1. Maitrise des documents

1.1.1. Documents contractuels

Un dossier complet du marché est en permanence disponible sur le site auprès du directeur de travaux. Les documents généraux d'origines extérieures auxquels le marché peut faire référence sont accessibles auprès du responsable de la bibliothèque du bureau d'étude technique du siège de l'entreprise.

1.1.2. Documents émis par l'Entreprise

Tous les documents techniques, Assurance Qualité ou Hygiène et Sécurité émis par l'Entreprise sont rédigés et vérifiés selon les dispositions retenues dans la procédure Maîtrise des documents (PG01). Selon cette procédure, les documents comportent tous un cartouche sur lequel sont reportées toutes les informations nécessaires à la maîtrise du document.

Ils font l'objet de deux états distincts (un technique et l'autre Assurance Qualité et Hygiène et Sécurité) tenue à jour en permanence par le Chargé Qualité (Enregistrement des documents de chantier).

1.1.3. Gestion des documents de chantier

Tout document d'étude arrivant sur le chantier est enregistré sur le registre d'enregistrement des documents de chantier (VCMF FO48) ou similaire qui précise :

- l'origine du document et ses références.
- sa date d'arrivée.
- sa destination (client pour information ou observations, bureau d'étude pour modification, chantier ...).

Sauf prescription contraire au marché, ou autre convention entre les parties, le délai de carence pour observations sur les documents est fixé à 15 jours calendaires.

Au retour du document, le chargé Qualité inscrit sur le registre d'enregistrement la nouvelle date d'arrivée du document et sa provenance, ainsi que son état :

- soit la mention "VSO" (Visa Sans Observation) si le client l'a portée sur le document. Le document est alors diffusé sur le chantier avec la mention " Bon Pour Exécution ". Les documents émis par le Bureau d'Etudes de l'Entreprise passent à l'indice supérieur en devenant BPE.
- soit la mention "VAO" (Visa Avec Observations) si le client l'a portée sur le document, qui fait alors l'objet de corrections ou justifications par le bureau d'étude avec émission du document avec un nouvel indice.

Les plans et notes de calcul à un indice périmé sont systématiquement détruits sur le chantier ou annulés de façon non équivoque (cartouche rayé en diagonale). Un exemplaire de chacun de ces plans et notes de calcul est conservé par le chargé Qualité et rangé dans le dossier "Plans et notes de calcul périmés" qui fait partie du dossier de réalisation de l'opération.

1.1.4. Modification des documents

Les modifications sont indiquées dans le cartouche de la page de garde du présent document.

En cas de modifications à apporter aux procédures d'exécution, la procédure d'exécution peut être indicée (indice supérieur).

Pour les changements mineurs ou en urgence, la procédure minute (FO72) pourra être utilisée. Cette procédure minute permet de :

- Matérialiser, à la main si besoin, les additifs ou modifications à une procédure existante
- Se poser à ce moment-là les questions liées à ces modifications ou à une tâche complémentaire non prévue initialement.

1.2. Maitrise des enregistrements

Le Chargé Qualité est chargé de la tenue des dossiers suivants et les enregistre dans le registre d'enregistrement des documents chantier (FO48).

Dossier Assurance Qualité et Respect de l'Environnement :

- PAQE

- Procédure d'Exécution / Procédure minute (cette dernière est à rédiger lorsqu'une modification de la procédure d'exécution doit être tracée et que son utilisation est urgente)
- Plans de contrôles et fiches de contrôles
- Documents de suivi (registre d'enregistrement, PV)
- Fiche d'amélioration
- Comptes rendus de réunion (réunion de chantier, revue de conception)
- Audit interne (rapport d'audit, fiches d'écart d'audit)
- Fiches de suivi de levée de réserves

Dossier de maîtrise de la définition du projet :

- Fiches de non-conformités (FO03)

Dossier fournisseurs et sous-traitants :

- Commandes, PV de réception et documentation qualité.

Dossier de récolement :

- Plans et notes de calcul au dernier indice (conforme à l'exécution).

L'ensemble de ces dossiers sera conservé à l'agence dont dépend le chantier pendant dix ans à compter du décompte général définitif des travaux.

A la fin des travaux, lors de la réception des ouvrages, et à la demande du client un dossier final d'ouvrage lui est remis. Ce dossier comporte le dossier Assurance Qualité, le dossier de récolement et le dossier de maîtrise de la définition du projet.

2. Contrôles (ISO 9 001 §8.2.4)

Définitions :

- **Point critique** : point sensible qui nécessite l'information préalable du demandeur pour qu'il puisse s'il le désire réaliser le contrôle ou le valider.

Logique du contrôle : Convocation → Contrôle → Enregistrement → Poursuite des travaux.

- **Point d'arrêt** : point sensible qui nécessite l'information préalable du demandeur pour qu'il puisse réaliser et valider le contrôle, et, pour lequel la poursuite de l'exécution est conditionnée par le contrôle effectif et l'accord du demandeur.

Logique du contrôle : Convocation → Contrôle → Enregistrement → Accord → Poursuite des travaux

Le contrôle des travaux est réalisé à trois niveaux :

- **Contrôle interne** : l'équipe de réalisation (chef de chantier, chef d'équipe, compagnons) effectue des contrôles systématiques en cours de travaux (autocontrôle). Le responsable des travaux, le chargé de qualité ou toute autre personne de l'encadrement effectuent des contrôles internes sur des points sensibles. Ces contrôles sont matérialisés sur des fiches de contrôle.

- **Contrôle externe** : la fiabilité du système qualité et des contrôles internes est validée par le Responsable Qualité ou une personne mandatée par la direction qui peut effectuer des visites de chantier et procéder par sondage pour s'assurer du bon fonctionnement de l'organisation qualité du chantier.
- **Contrôle extérieur** : Ce contrôle, demandé ou effectué par le client ou des organismes mandatés par lui, peut être effectué à l'improviste ou défini au préalable par des points critiques et points d'arrêt. Les contrôles sur PC et PA sont effectués en présence du chargé de qualité qui établit les fiches de contrôle et les fait viser au client.

La liste des opérations de contrôle est donnée en Annexe 3. Le suivi des opérations de contrôle est décrit dans les procédures jointes au PAQE.

3. Maitrises des Ouvrages Provisoires

En application du guide de maîtrise des ouvrages provisoires (GUI02) :

- Un chargé des ouvrages provisoires est désigné pour chaque ouvrage (FO12).
- La liste des ouvrages provisoires est établie (FO11).
- Les contrôles associés sont mis en place (FO13, 14, 15, 16, 17).

4. Propriété des clients ou des prestataires externes (ISO 9 001 §8.5.3)

Les différents matériaux, produits ou composants fournis par le client pour être incorporés à l'ouvrage doivent être accompagnés des instructions nécessaires relatives à la réception, la manutention, le stockage, la mise en œuvre et la protection.

Produits fournis par le client	Responsable de la réception

Ces produits et équipements font l'objet d'une réception avec PV de préférence contradictoire avec le client.

5. Maitrise des équipements de Surveillance et Mesure (ISO 9 001 § 9.1)

Dans le cadre de l'opération, les équipements concernés sont : Sonde turbidité
Citer les équipements de surveillance et mesure par exemple sondeur théodolite niveau distomate ...

Voir procédure de maîtrise des équipements de surveillance et mesure (ESM) (PG22).

6. Maitrise du produit non-conforme (ISO 9 001 §10.2)

Les non-conformités décelées sur le chantier sont de deux types :

- **Non-conformité pouvant être traitée en interne** (appelée NC interne dans ce qui suit) : il s'agit de manquement ou d'erreur qui peuvent être corrigés immédiatement sans incidence sur la qualité de l'ouvrage par application des règles de l'art ou par application d'une procédure existante. Il peut s'agir d'un manquement relatif aux processus (matériel utilisé, fournitures, interactions entre divers intervenants).
- **Non-conformité externe ou sur produit fini** : il s'agit de non-conformités qui nécessitent l'application d'une procédure de réparation spécifique pour ne pas mettre en cause la conformité finale de l'ouvrage, qui conduisent à demander au représentant du client d'accepter la correction proposée ou le produit non-conforme aux spécifications avec dérogation ou qui conduisent à rebuter ou démolir la partie d'ouvrage concernée.

Le traitement d'une non-conformité externe suit la procédure suivante :

La non-conformité décelée, le Conseiller QPE est aussitôt informé. Il rédige la première partie de la **fiche de non-conformité** (FO03) dans laquelle sont analysées les anomalies observées et les causes recherchées, selon la procédure PG05 "Maîtrise des non-conformités".

- Le responsable des travaux, en collaboration éventuelle avec le Bureau d'Etudes de l'Entreprise et tout technicien dont il souhaite s'entourer, propose dans la seconde partie de la fiche de non-conformité la correction qu'il juge la mieux adaptée : demande de dérogation, réparation, rejet ou démolition.
- La fiche ainsi complétée est diffusée au chef d'agence, au Maître d'œuvre, au Correspondant Qualité Prévention Environnement Agence et au Responsable Qualité Environnement de l'Entreprise.
- Le Maître d'Œuvre indique sa décision sur la fiche et la retourne au responsable des travaux.
- Après accord sur la solution retenue, la fiche de non-conformité est complétée jusqu'au constat de l'acceptation de la partie d'ouvrage concernée ou son refus définitif.
- Le responsable des travaux décide de l'opportunité d'ouvrir une fiche d'action corrective s'il existe un risque de renouvellement de la non-conformité.
- La fiche est alors classée dans le dossier "Maîtrise de la définition du projet" du chantier.

Le traitement d'une non-conformité interne suit la même procédure que celle de la non-conformité externe, seuls, 2 points diffèrent :

- La formalisation de la non-conformité interne se fait sur une **fiche d'amélioration - Fiche de non-conformité** (FO03)
- Le client n'intervient pas dans le traitement de l'écart constaté, la détection et la correction restent internes à l'entreprise.

Les réclamations des clients relatives au système QPE, à la qualité de l'ouvrage en cours de travaux sont gérées par le responsable des travaux en liaison avec le chef d'agence et si besoin la Direction d'Exploitation et le service juridique de l'Entreprise. Le support de traitement des réclamations client est la fiche de non-conformité.

7. Actions correctives et préventives (ISO 9 001 §10.2)

Dans le cas de non-conformités effectives ou potentielles de l'ouvrage, que ces non-conformités proviennent de la mauvaise application du processus défini, d'un PAQE ou de procédures inappropriées, une action corrective ou préventive est engagée selon une des procédures suivantes :

7.1. Action Corrective

En cas de non-conformité majeure constatée, l'action corrective pour éviter son renouvellement, apparaît sur la fiche d'amélioration selon la procédure PG05 "Maitrise des non-conformités – Actions correctives".

7.2. Action Préventive

En cas de situation pouvant conduire à une non-conformité de l'ouvrage, une fiche d'amélioration est ouverte et exploitée selon la procédure PG05 " Maitrise des non-conformités – Actions correctives ".

8. Demande de Clarification, Modification ou Dérogation

Si malgré la revue de contrat effectuée avant la signature effective du marché, l'Entreprise découvre, en cours de réalisation, des ambiguïtés, des imprécisions, des incompatibilités ou des erreurs, le responsable des travaux les signale aussitôt au Maître d'Œuvre. Un état de ces fiches navettes est tenu à jour par le responsable des travaux.

Les réponses et les conséquences de ces réponses telles que : modifications ou adaptations du projet, modifications éventuelles du coût de l'ouvrage ou du délai global de réalisation de l'ouvrage, sont documentées de la même façon que les exposés initiaux des problèmes correspondants.

Les fiches navettes, les réponses, leur suivi et les nouveaux documents qui s'y réfèrent, constituent le dossier de maîtrise de la définition du projet qui fait partie du dossier de réalisation de l'opération.

9. Formation

L'accueil du personnel est systématiquement fait à son arrivée sur le site et les informations ou formations sur les consignes applicables au chantier lui sont expliquées (fiche d'accueil VCMF FO38).

Des réunions de sensibilisation à la Qualité, à la Sécurité et à l'Environnement sont prévues en début de chantier pour l'ensemble du personnel.

Les dispositions générales en matière de formation sont définies dans la procédure de formation du personnel (PG13).

10. Système de Management Environnemental

10.1. Missions et Responsabilités

- Le Chargé Environnement a la responsabilité du contrôle interne. Il dépend de la direction du chantier. Il s'assure du respect des exigences et de la prévention des risques vis à vis de l'environnement.

Son rôle consiste à :

- s'assurer de la conformité du marché et du PAQE
 - prévenir les situations d'urgence et capacité à réagir
 - sensibiliser et informer en interne
 - exécuter ou faire exécuter les contrôles internes
-
- Le Chef de chantier a la responsabilité d'assurer le respect des obligations contractuelles. Par conséquent, il est de son devoir de définir et de maintenir les ressources humaines, matérielles et l'équipement nécessaire et de diriger et de coordonner l'ouvrage.

10.2. Sensibilisation du personnel à l'Environnement

Avant le démarrage du chantier, lors de l'accueil du personnel, une sensibilisation à la gestion de l'environnement sera réalisée par le Chargé Environnement pour tout le personnel.

Cette sensibilisation, au même titre que la Qualité et la Prévention conditionne leur prise de fonction.

De plus, lors des 1/4h d'activité hebdomadaires, un point environnement peut être mis à l'ordre du jour.

Des affichages 'environnement' spécifiques à l'activité de l'Entreprise sont disposés au niveau des installations de chantier ([Annexe 6](#)).

10.3. Autres intervenants sur le chantier

Le PAQE du chantier doit être transmis à chaque sous-traitant ou prestataire amené à intervenir sur le chantier ; ces derniers doivent :

- Soit nous retourner une lettre d'engagement à respecter les mesures décrites dans notre PAQE.
- Soit réaliser eux-mêmes un PAQE relatif à leur activité.

Les fournisseurs, quant à eux, reçoivent un plan d'accès au chantier et doivent le respecter.

10.4. Organisation du Respect de l'Environnement

10.4.1. Politique Environnementale


100% du personnel doit être sensibilisé à l'Environnement et au Développement Durable via :

- L'accueil
- Les 1/4h d'activité.
- Les affichages environnement

Les **10 critères du chantier respectueux de l'environnement** seront respectés.

Le label Attitude Environnement

10 critères à respecter sur le chantier

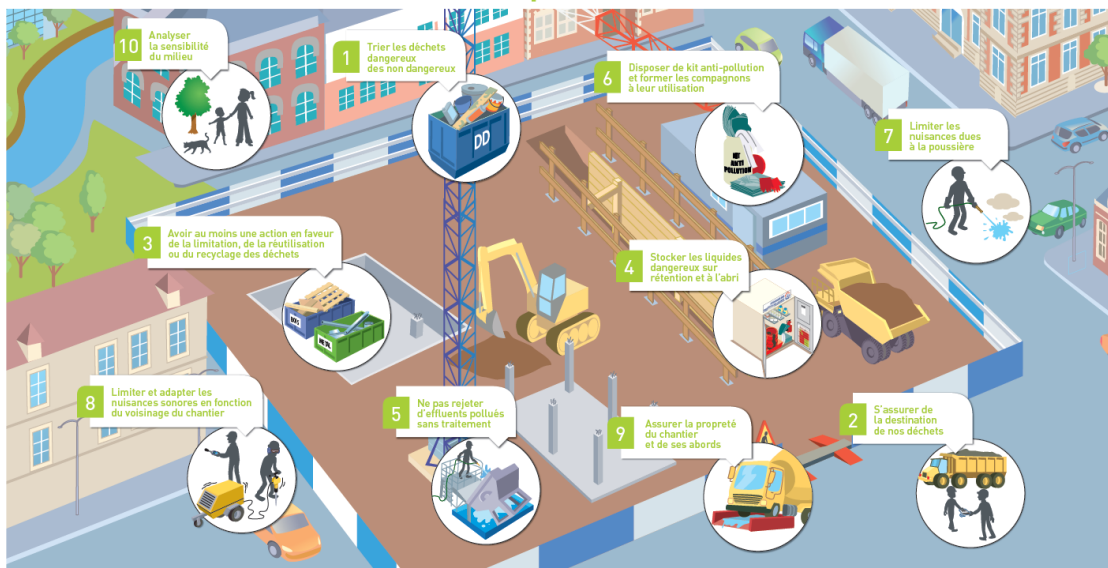

Ces 10 critères sont les suivants :

- 1) Trier les déchets dangereux des non dangereux
- 2) Avoir au moins une action en faveur de la réutilisation ou du recyclage des déchets
- 3) S'assurer de la destination des déchets
- 4) Stocker des liquides dangereux sur rétention et à l'abri des intempéries
- 5) Mettre à disposition un kit anti-pollution
- 6) Limiter les rejets directs dans le milieu naturel
- 7) Propreté du chantier et de ses abords
- 8) Limiter et adapter les nuisances sonores au voisinage du chantier
- 9) Limiter les émissions dans l'air
- 10) Prendre en compte la sensibilité du milieu

La démarche environnementale concerne également les bureaux et autres sites fixes :

- Augmenter la part de déchets recyclés dans les bureaux et installations de chantier
- Conformité réglementaire des sites fixes vis-à-vis de la réglementation ICPE
- Réduire les consommations d'énergie et si possible les émissions de CO2 en général (ex : Bungalows à faible consommation d'énergie...).

10.4.2. Sensibilité du site

La **sensibilité du site** sur lequel vont être effectués les travaux sera prise en compte. Le site est situé sur / à proximité des zones suivantes :

Eau		Nuisances	
Travaux fluviaux	☒	Zone urbaine	☒
Proximité de zone aquacole / piscicole	☐	Proximité de zone résidentielle	☐
Proximité de captage d'eau potable	☐	Proximité de zone sensible (école, hopital, maison de retraite...)	☐
Proximité de nappe phréatique superficielle	☐	Proximité d'activité de loisirs, tourisme	☒

Urbanisme, construction		Faune et flore	
Proximité d'un site industriel	☒	Proximité d'un milieu naturel remarquable : ZNIEFF, marais, tourbière, espace boisé classé, zone Natura 2000, parc naturel...	☐
Réalisation des travaux sur un site industriel en activité	☒	Patrimoine	
Réalisation des travaux sur un ancien site industriel	☐	Proximité d'un monument historique - site classé : château, église...	☐

10.4.3. Cadre Réglementaire Environnemental

Les **contraintes environnementales et réglementations locales** seront examinées et respectées.

Les travaux font l'objet d'un arrêté préfectoral, dans le cadre :

- ☒ De la loi sur l'eau
- ☐ Des Installations classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)
- ☐ Autres ; Préciser -----

10.4.3.1. Loi sur l'Eau

La **Loi sur l'Eau** concerne l'ensemble des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) qui peuvent entraîner un impact sur le milieu aquatique :

- Prélèvements d'eau ;
- Rejets dans le milieu naturel ;
- Travaux sur cours d'eau ou en mer.

La **nomenclature loi sur l'eau** détermine le périmètre d'application de la loi et le régime applicable (déclaration ou autorisation) selon les travaux réalisés.

Vinci Construction Maritime et Fluvial informe si nécessaire le Maître d'Ouvrage des travaux soumis à la Loi sur l'Eau.

Le maître d'ouvrage réalise et dépose la demande en Préfecture. Ce dernier peut déléguer cette responsabilité si le marché le précise.

Avant de démarrer un chantier Vinci Construction Maritime et Fluvial s'assurera que les démarches administratives ont bien été réalisées.

Les travaux exécutés en vue de prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence sont dispensés des règles de procédures de déclaration ou d'autorisation même temporaires délivrée au titre de la Loi sur l'Eau.

Si le chantier est soumis à déclaration, un arrêté ministériel s'applique selon la rubrique (Arrêtés du 27/07/06 et Arrêtés du 07/08/06).

Dans le cas d'une autorisation, le chantier devra appliquer un arrêté préfectoral qui lui sera spécifique (à annexer au présent document).

Si applicable, un plan d'action visant au respect de l'arrêté sera réalisé et suivi par le chantier.

10.4.4. Prise en compte de l'Environnement et de ses contrôles environnementaux

Pour chaque phase de travaux, une analyse des nuisances et des risques potentiels vis-à-vis de l'environnement est effectuée, qu'ils proviennent des matériels, des matériaux ou encore des méthodes utilisées.

Afin de les limiter voire même les supprimer, des mesures de protection sont prises dans le respect des dispositions imposées dans le cadre de la réglementation et par le client.

Cette analyse fait l'objet de la mise en place d'un tableau de prise en compte de l'environnement et contrôle environnementaux.

Pour chaque phase de travaux ou zone à risque, apparaissent :

- Les aspects et impacts environnementaux,
- Les moyens retenus pour diminuer le risque,
- Les contrôles d'efficacité des moyens.

Tableau De Prise En Compte De L'Environnement Et Contrôles Environnementaux

Tâche concernée	Aspect environnemental	Milieu concerné ¹	Source de nuisance / pollution	Impact environnemental	Moyens de prévention et de contrôle
Terrassements	Bruit	Riverains	Pelles hydrauliques, B.R.H, Camions 6x4	Gêne occasionnée	Conformité décret et arrêté en vigueur, plages horaires définies au marché. Des contrôles de niveaux sonores pourront être effectués à la demande du client.
Terrassements	Découverte fortuite de vestiges	Patrimoine	Mise à jour de matériaux ayant un caractère artistique, archéologique,	Destruction du patrimoine	Art. 33 du CCAG. Signalement au maître d'œuvre, déclaration à la Mairie concernée. Les matériaux ne sont pas déplacés sans autorisation de la personne responsable du marché. Les matériaux détachés fortuitement du sol sont gardés en lieu sûr.

Tâche concernée	Aspect environnemental	Milieu concerné ¹	Source de nuisance / pollution	Impact environnemental	Moyens de prévention et de contrôle
	archéologiques		historique ou restes humains		
Nettoyage des toupies et bennes béton	Rejet de laitances	Sol, eau	Rejet eaux souillées	Pollution	Lavage sur aire étanche. Ex : fosse équipée d'un polyane, permet après décantation de récupérer l'eau claire. Le dépôt après séchage est éliminé comme déchet inerte. Traitement du pH avec par exemple utilisation de glace carbonique. Vérification du pH de l'eau décantée avant rejet
Démolition	Production de déchets	Paysage...	Déchets inertes	Pollution visuelle	Produits de démolition réutilisés en remblai sur chantier lorsque cela est possible ou évacués vers plateforme de recyclage
Brise Roche	Vibrations	Sol	Brise roche	Effet sur le patrimoine	Vibrations amorties très rapidement et devenant rapidement imperceptibles. (les vitesses particulières deviennent insignifiantes au-delà de 10m pour les plus gros brise-roche)
Approvisionnement en carburant	Egouttures / débordement	Eau, sol	Carburant	Pollution	- vérification des raccords au niveau des flexibles utilisés pour l'approvisionnement - utilisation de pistolet d'approvisionnement à gâchette anti-retour - récupération des égouttures par rétention, kit absorbant à proximité du point d'approvisionnement - informer le fournisseur de carburant des précautions à prendre vis-à-vis de l'environnement
Travaux maritimes / fluviaux	Entrave à la circulation	Navigation	Positionnement du matériel flottant	Perturbation	Priorité est laissée à la navigation fluviale/maritime/portuaire (moyens de communication à disposition de l'équipage : VHF, téléphone portable)
Engins Hydrauliques terrestres/flottants	Rupture ou fuite de flexible	Eau, sol	Huiles hydrauliques	Pollution	Utilisation d'huile hydraulique biodégradable* et Kit d'intervention d'urgence à disposition*, inspection périodique des flexibles ; sur l'eau, barrages flottants à disposition
Stockage Hydrocarbures	Egoutture, fuite	Eau, sol	Cuves de stockage	Pollution	bac rétention, cuve double paroi, dalle béton si cuve 'terrestre'
Stockage liquides / produits dangereux	Egouttures	Eau, sol	Peintures, solvants, diluants, huiles moteur...	Pollution	Stockage en bacs de rétention refermables aérés, liste des produits dangereux + FDS données en annexe 5 du PAQE. L'évaluation des risques chimiques des produits est disponible et la fiche d'information sur le Risque Chimique (FIRC) est disponible sur le chantier.
Matériel de levage	Bruit	Riverains	Grues mobiles	Gêne occasionnée	Conformité décret en vigueur, respect des plages horaires définies au marché
Engins de chantier	Egouttures huiles	Sol	Moteurs thermiques	Pollution	- Entretien et vérification carters moteurs, vérification des entretiens pour le matériel de location
Engins de chantier	Emissions de gaz	Air	Moteurs thermiques	Pollution	- Entretien et vérification moteurs, vérification des entretiens pour le matériel de location
Vidange engins	Egouttures	Eau, sol	Huiles usagées	Pollution	Stockage en cuve étanche sur rétention, évacuation par organisme agréé**,
Circulation véhicules	Poussières	Air	Circulation sur pistes	Pollution	- Vitesse limitée à 30 km/h - Arrosage des pistes
Circulation véhicules	Dégradation de la voirie	Activités humaines	Circulation sur voiries existantes	Effet sur le patrimoine	Etablissement d'un plan de circulation et d'un plan de maintien des accès
Production électricité	Bruit	Riverains	Groupe électrogène	Gêne occasionnée	- Emplacement fixe : Branchements sur secteur - Itinérant : Groupes insonorisés
Prod. air comprimé	Bruit	Riverains	Compresseurs	Gêne occasionnée	- Emplacement fixe 1: Adoption compresseurs électriques - Itinérant : Compresseur insonorisé
Balilage	Absence de balilage	Milieu naturel	Activité chantier	Perturbation du milieu	Clôtures vérifiées périodiquement Accès indiqués et respectés

Tâche concernée	Aspect environnemental	Milieu concerné ¹	Source de nuisance / pollution	Impact environnemental	Moyens de prévention et de contrôle
Installations chantier terrestre	Rejet d'eaux usées	Eau, sol	Eaux usées	Pollution	Raccordement au réseau existant
Installations chantier terrestre	Consommation d'eau	Air, eau, sol	Consommation Excessive	Diminution ressource naturelle	Utilisation de Bungalows « Economie d'énergie » : Double vitrage, Isolation parois, Isolation toiture, Pilotage par horloge (chauffage et refroidissement), Eclairage par détection présence, Capteurs d'asservissement aux fenêtres, Volets roulants
Lavage du matériel	Consommation d'eau	Eau	lavage et essais	Diminution ressource naturelle	Limitation de la consommation d'eau
Lavage du matériel	Infiltration	Sol	des eaux de ruissellement et de lavage	Pollution	Le lavage est réalisé sur des aires étanches équipées de séparateurs hydrocarbures
Production de déchets des Installations chantier	Production de déchets	Eau, sol, paysage...	Déchets non dangereux	Pollution	-déchets ménagers des cantonnements : bacs fournis et évacués par la commune
Production de déchets inertes	Production de déchets	Paysage...	Déchets inertes	Pollution visuelle	Terres non polluées, gravats : réutilisés en remblai sur chantier lorsque cela est possible ou évacués en centre de stockage pour déchets inertes agréés
Production de déchets non dangereux	Production de déchets	Eau, sol, air, paysage...	Déchets non dangereux	Pollution	-Ferraille, bois : triés et stockés sur site puis évacués par organisme agréé pour recyclage Le brûlage des déchets est interdit -emballages : triés puis évacués vers centre de transfert agréé
Production de déchets dangereux	Production de déchets	Eau, sol, paysage...	Déchets dangereux	Pollution	Filtres à huile, chiffons souillés, produits absorbants souillés, fût et bidons ayant contenu des produits dangereux : évacués par centres agréés, BSDD*** conservés sur le chantier
Tous travaux : Risque incendie	Incendie	Milieu naturel/personnel	Origine électrique, soudure...	Effet sur le milieu, gêne riverain, pollution	Feux interdits. Sensibilisation au risque incendie. Extincteurs présents sur site. Voir PPSPS

Les **situations d'urgence environnement** sont identifiées et leur prise en compte est décrite en annexe 4.

Le **Registre environnement** (FO200) permet de consigner pour le chantier les consommations en eau, électricité, fioul, le suivi déchets (cf registre déchets), le suivi des incidents environnementaux.

10.5. Schéma d'élimination des déchets

Les niveaux de gestion des déchets sont les suivants :

- Niveau 1 : réduction à la source de la quantité et de la toxicité des déchets produits (technologie propre).
- Niveau 2 : recyclage ou valorisation des déchets.
- Niveau 3 : traitement ou prétraitement des déchets : traitement physico-chimique, détoxification, incinération.
- Niveau 4 : mise en centre de stockage.

Ces dispositions sont réalisées soit par l'Entreprise (niveaux 1 et 2), soit par une entreprise spécialisée extérieure (niveaux 2, 3 ou 4).

Dans la gestion des déchets générés par les travaux, on recherchera les solutions de niveau les plus faibles possibles, compte tenu des contraintes, le niveau 4 correspondant à la solution extrême.

10.5.1. Déchets produits par le chantier

a) Les déchets inertes

Un déchet est considéré comme **inerte** « s'il ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine »



Type de déchets rencontrés en phase travaux :

- les bétons
- les pierres, tuiles, briques, verre
- les terres, granulats et gravats non pollués

b) Les déchets Non Dangereux (DND)

Selon la réglementation, les déchets non dangereux sont les déchets qui ne sont pas définis comme dangereux par le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002. Ce sont des déchets non dangereux, non inertes, non toxiques pour l'homme ou pour l'environnement.

Le brûlage des déchets est interdit

Type de déchets rencontrés en phase travaux :

- Câbles, ferrailles
- Ordures ménagères ou assimilables
- Déchets plastiques (emballages,)
- Cartons non souillés

- Bois

c) Les déchets Dangereux (DD)

Définition : Ce sont des déchets toxiques ou dangereux pour la santé humaine et pour l'environnement.

Type de déchets rencontrés en phase travaux :

- Matières souillées (gants chiffons souillés, protection auditives...)
- Piles, batteries
- Fûts ayant contenu des produits dangereux (hydrocarbures, huiles de décoffrage, solvants....)
- Aérosols

d) Les déchets verts

Définition : Ce sont des déchets provenant de la coupe des arbres, tontes....qui sont non toxiques pour l'homme et l'environnement. Ils appartiennent à la catégorie des déchets non dangereux.

- Abattage des arbres et déchets putrescibles (matières organiques, déchets vert...)

10.5.2. Collecte, Conditionnement, Tri

Selon l'environnement du chantier, plusieurs bennes pourront être disponibles pour permettre le tri des déchets parmi les catégories suivantes :

- Déchets inertes
- Chutes d'acier
- Bois
- Ordures ménagères provenant des cantonnements.
- Déchets dangereux

Les bennes seront clairement identifiées à l'aide de pictogrammes.



Le circuit et la circulation des camions respecteront le cahier des contraintes fonctionnelles du site.
Une sensibilisation du personnel sera faite sur ces points lors de l'accueil, puis lors de réunions spécifiques.

10.5.3. Filières d'élimination

Le prestataire de service 'évacuation et mise en centre de stockage des déchets' sera retenu en fonction de la qualité de son offre, et en particulier de ses agréments (arrêtés préfectoraux lui donnant l'autorisation d'exercer l'évacuation, la mise en centre de stockage, le transport...) et de son engagement à respecter la réglementation en vigueur.

Le transporteur sera spécialisé et agréé et nous fournira des BSDD (bordereau de suivi des déchets dangereux) lorsque cela est nécessaire. La dépose et la manutention respecteront la réglementation en vigueur.

10.5.4. Suivi et traçabilité

Les bons d'enlèvement seront conservés et classés sur le chantier.




Dans le cas où l'élimination des déchets est gérée directement par le chantier, le Registre Déchets (FO70) sera tenu à jour pour tous les types de déchets.

Dans le cas de déchets dangereux, les bordereaux de suivi de déchets dangereux (BSDD) seront émis, puis classés et conservés sur le chantier (voir modèle de bordereau : FO194).

10.5.5. Synoptique du suivi des déchets

La **réutilisation** et le **traitement** des déchets doivent être encouragés dès lors qu'ils sont possibles. Cependant, suivant les conditions techniques et économiques, certains déchets ne peuvent être réutilisés ou recyclés ; ils doivent alors être éliminés dans des installations de stockage. En tout état de cause, la déconstruction sélective et le tri préalable sont la meilleure façon d'éliminer les déchets dans des filières adaptées.

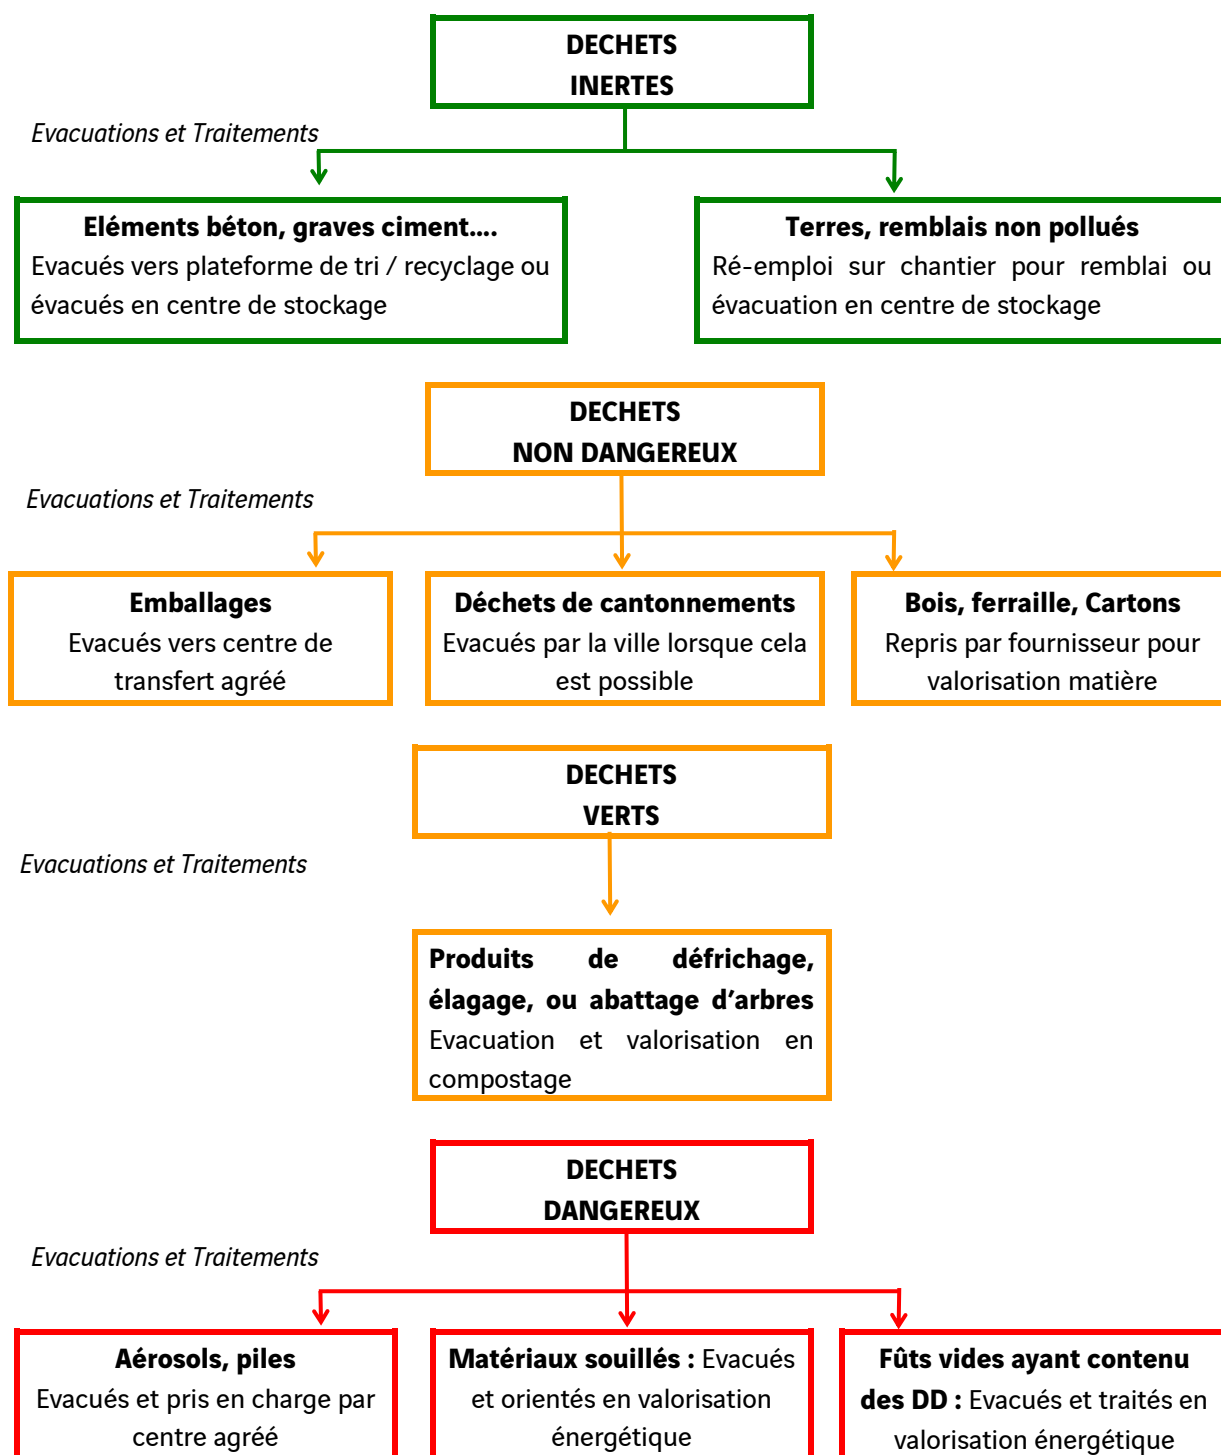



ANNEXES

Annexe 1 : Engagement de la Direction de chantier

Je soussigné Vincent BILLON (Tél : 07 77 88 01 09)

agissant en Qualité de Responsable des Travaux pour le compte de l'entreprise VINCI Construction Maritime et Fluvial déclare m'engager pour la réalisation du chantier :

**TRAVAUX DE REPARATION DU QUAI MAÇONNE, PORT DE LA GARE PARIS
13EME**

- à mettre en œuvre les dispositions définies au présent Plan d'Assurance Qualité et Environnemental qui couvre l'ensemble des exigences décrites dans les pièces écrites de la consultation dont j'ai pris connaissance
- à m'assurer par tout moyen (formation, enquêtes, contrôles, audits, etc. ...) de l'application de ce Plan d'Assurance Qualité et Environnemental par l'entreprise, ses fournisseurs et ses sous-traitants concernés
- à m'assurer de son efficacité.

Fait à Villeneuve le Roi

Le 22 septembre 2025

" Lu et approuvé



Annexe 2 : Liste des procédures d'exécution

LISTE DES PROCEDURES D'EXECUTION APPLICABLES SUR LE CHANTIER	
Chantier :	
Travaux de réparation du quai maçonné, Port de la Gare Paris 13ème	
Visa du conducteur de travaux : Romuald MARIE-JULIENNE (Tél : 06 11 63 19 79)	Visa du Directeur de Travaux : Romuald MARIE-JULIENNE (Tél : 06 11 63 19 79)

METTRE A JOUR LA LISTE DES PROCEDURES APPLICABLES SUR LE CHANTIER

N°	Indice	DESIGNATION
	0	25-081_EXE_OCE_PE_300_0_Nettoyage parements sous eau et hors d'eau
	0	25-081_EXE_OCE_PE_301_0_Procédure de rejointoiement des fissures
	0	25-081_EXE_OCE_PE_302_0_Procédure de remplacement de pierre de couronnement
	0	25-081_EXE_OCE_PE_303_0_Procédure de comblement des cavités sous eau
	0	25-081_EXE_OCE_PE_304_0_Procédure de mise en sécurité en cas de crue
	0	25-081_EXE_OCE_PE_305_0_Procédure du suivi de la qualité de l'eau 0

Annexe 3 : Liste des opérations de contrôle

Le suivi des opérations de contrôle est décrit dans les procédures d'exécution jointes à ce PAQE.

Partie d'ouvrage	Phase d'exécution	Opération influençant particulièrement la qualité	Critère de conformité	Moyens de contrôle	Responsable du contrôle	Document attestant de la formalisation du contrôle
Toutes	Préparation du chantier	Contrôle des documents d'études (plans, Notes de calculs, procédure, PAQE...)	Documents valides		MOE CSPS	Point d'arrêt
Pierres de couronnement	Contrôle de réception	Qualité de la pierre	Pas de fissures, ni d'épaufrures	Visuel	CC	Point d'arrêt
	Contrôle alignement	Précision de l'alignement des pierres entre elles	3 mm	Cordeau et niveau à bulle	CC	Point d'arrêt + fiche autocontrôle
	Contrôle hauteur	Précision de la hauteur de la pierre	6 mm	Cordeau et niveau à bulle	CC	Point d'arrêt + fiche autocontrôle
	Jointoiement	Bonne épaisseur des joints	1.5 cm	Mètre	CC	Point d'arrêt et fiche autocontrôle
Rejointoiement des pierres de chaînage	Piochage	Seuls les joints abimés		Contrôle visuel	CC + CE	Point critique + Fiche autocontrôle
	rejointoiement	Fait par un maçon et utilisation du bon mortier	Propreté des pierres autour du joint	Contrôle visuel	CC + CE	Point critique + Fiche autocontrôle
	Composition du mortier et ciment	Respect des normes	Bonne dosage des composants du mortier	Mode opératoire	CE	Point d'arrêt Fiche autocontrôle

Annexe 4 : Situation(s) d'urgence Environnement

Les situations d'urgence environnement seront présentées à tout le personnel de chantier lors de l'accueil et feront l'objet de rappels au cours du chantier.

(avec le « [Guide Environnement](#) » (GUI01))

SITUATION D'URGENCE	MESURE DE PREVENTION	ACTION IMMEDIATE	DEPOLLUTION
1. déversement accidentel d'hydrocarbures	Cuves stockées sur bacs de rétention, kits absorbants à disposition	Utilisation de produits absorbants adaptés et si nécessaire mise en place de barrage flottant pour confiner la pollution	Contacteur un organisme de dépollution agréé (Nom : Tel :) ex : SITA
2. rupture de flexible sur matériel hydraulique	Inspection périodique des flexibles par le chantier et le service matériel (échange éventuel)	Mise en œuvre de kits anti pollution : -Barrage absorbant flottant -feuillet absorbants hydrophobes	Évacuations des absorbants souillés avec les déchets dangereux du chantier, éventuellement, pour les grandes quantités, faire effectuer un pompage par une société agréée.
3. déversement accidentel de produits dangereux	Bidons de produits dangereux (produits décoffrants, huiles, peintures, aérosols...) stockés en bacs de rétention refermables	Utilisation de produits absorbants adaptés et si nécessaire mise en place de barrage flottant pour confiner la pollution	Évacuations des absorbants souillés avec les déchets dangereux du chantier
4. Déversement d'huiles – carburant sur la zone de stationnement du chantier	Protection de la zone par un polyane et évacuation vers un puisard	Utilisation de kits d'intervention d'urgence pour contenir la pollution	Pompage par camion hydrocureur, évacuation des absorbants souillés avec les déchets dangereux du chantier
5. Incendie	Feux interdits. Sensibilisation au risque incendie. Extincteurs présents sur site. Voir PPSPS	Utilisation extincteurs, appel pompiers si propagation incendie Voir « Message d'alerte » affichage chantier	Evacuation des eaux polluées selon réglementation
6. Naufrage d'un engin	Entretien du matériel, surveillance des conditions météo, amarrage en sécurité.	Evacuation. Mise en œuvre de kits anti-pollution : -Barrage absorbant flottant -feuillet absorbants hydrophobes	Appel des pompiers. Contact organisme de dépollution agréé si nécessaire

A PREVENIR EN SITUATION D'URGENCE

EN INTERNE :

Vincent BILLON (Tél : 07 77 88 01 09)

A L'EXTERIEUR :

Les **POMPIERS** au **18** (ou **112** depuis un portable).

1. ICI Société **VINC Construction Maritime et Fluvial**

2. Indiquer :
 - La nature de la situation d'urgence.
 - La nature et quantité des produits éventuellement déversés.
3. Fixer un point de RENDEZ-VOUS :
Adresse : Port de la Gare Paris 13^{ème}
4. NE PAS RACCROCHER LE PREMIER - Faire répéter le message.

AUTRES NUMEROS UTILES :

Dinis ALVES (Tél : 06 14 15 10 54)
Gabriela DA LUZ (Tél : 06 23 88 63 34)

Annexe 5 : Liste des produits dangereux

Les **FDS** -Fiches de données sécurité- doivent être disponibles sur le chantier.

Les **FIRC** -Fiches d'Information Risque Chimique- doivent être disponibles à proximité des stockages de produits.

Elles sont à disposition via les liens suivants :

- Les FDS et FIRC associées des produits habituellement utilisés sur nos sites sont disponibles sur l'Intranet Vinci Construction France : [lien](#)
- Possibilité de télécharger les FDS qui ne sont pas sur l'intranet sur internet : <http://www.quickfds.com/>.
- Sinon, en faire la demande au Fournisseur.


Ces liens sont présentés par ordre de priorité de consultation.

Catégorie de produit	DESIGNATION FOURNISSEUR	Pictogramme dangerosité	Conditionnement	Quantité	FDS	FIRC disponible
Marline 2T et 4T		Danger pour le santé Inflammable Polluant Nocif	Bidon entre 5 et 20L	1	Classeur sécurité	Affichage container de stockage
Bombes traçantes		Inflammable Nocif	500 mL	1	Classeur sécurité	Affichage container de stockage
Huile de décoffrage		Toxic Corrosif Polluant			Classer sécurité	Affichage container de stockage
Huile Hydraulique minérale		Danger pour la santé Corrosif Inflammable			Classeur sécurité	Affichage container de stockage
Mortier 152		Corrosif Nocif	25 kg		Classeur sécurité	Affichage container de stockage
Mortier 736		Corrosif Nocif	25kg		Classeur sécurité	Affichage container de stockage
Lankopassiv 760		Inflammable Nocif	3L		Classeur sécurité	Affichage container de stockage
Mortier pierre TF		Nocif Corrosif	25 kg		Classeur sécurité	Affichage container de stockage
Mortier pierre DF		Nocif Corrosif	25 kg		Classeur sécurité	Affichage container de stockage
Prompt		Nocif Corrosif	25 kg		Classeur sécurité	Affichage container de stockage



Épicol T		Nocif Polluant Corrosif			Classeur sécurité	Affichage container de stockage
----------	--	-------------------------------	--	--	----------------------	---------------------------------------

Annexe 6 : Affichage Environnement du chantier

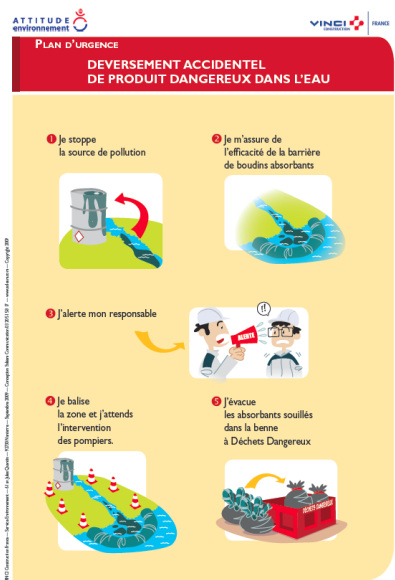



Annexe 7 : Plan d'action Respect des prescriptions Loi sur l'Eau ou ICPE

N°	Réf. Texte	Exigence	Action à mettre en place	Responsable de l'action	Date	Vérification de l'efficacité
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

