

CHANTIER FAIBLES NUISANCES

01/12/2025

APPRÉCIATION GÉNÉRALE

Légende	Bonne	Moyenne	Mauvaise
SUJETS	CONFORMITÉ		
Aspect général du chantier	Bonne		
Management	Bonne		
Déchets	Bonne		
Traitement des pollutions	A vérifier lors de la prochaine visite		
Energie et ressources	Moyenne : actuellement, l'électricité est fournie par un générateur		
Biodiversité	Bonne		

TABEAU DE CONTRÔLE

TYPE DE CONTROLE	ÉTAT ✓/✗ /so	COMMENTAIRES	
ASPECT GENERAL DU CHANTIER			
Etat des palissades	✓	CR1 : Bon état – Voir photos	#1
Etat et propreté des voiries	✓	CR1 : Bon état – Voir photos	#2
Chantier propre et ordonnée	✓	CR1 : Bon état – Voir photos	#3
MANAGEMENT			
Dispositif de gestion des plaintes mis en place (boîte aux lettres, boîte mail, etc.)	✗	CR2 : En cours d'installation	


TYPE DE CONTROLE	ÉTAT ✓/✗ /so	COMMENTAIRES	
Suivi des plaintes + réponses en cas de plaintes recensées	SO	CR1 : En cours	
Des 1/4h environnement sont réalisés périodiquement avec feuille de suivi associée	SO	CR1 : Prévu. Transmettre le support de présentation à Essor	
Transmission du PIC	✓	CR1 : conforme	
Document de procédure de gestion des risques de crue	✓	CR2 : transmis et conforme	
DECHETS			
Séparation déchets dangereux/déchets non dangereux	SO	CR2 : Prévu. Vérification par Essor lors des prochaines visites	
Vérification sur les volumes de produits dangereux stockés : la capacité des bacs de rétention doit être en accord	SO	CR1 : En cours. A vérifier lors des prochaines visites	
Traçabilité des déchets dangereux	SO	CR1 : Suivi prévu sur Track déchets	
Tri à la source des déchets inertes et des DND valorisables	✓	CR1 : Tous les déchets du chantier sont valorisables	
Signalétique des bennes	✓	CR1 : Identification des bennes réalisée	#4
Suivi du registre déchets	SO	CR1 : Registre à rendre en fin de chantier, en attente des BSD	
Prestataire de traitement et valorisation des déchets	✗	CR2 : préciser le(s) prestataire(s) déchets avec l'attestation de valorisation de déchets	
Si pas de contrat cadre avec le prestataire, apporter la preuve que la plateforme de tri obtient 70% de valorisation de matière pour les DND en mélange	✗	CR2 : préciser le(s) prestataire(s) déchets avec l'attestation de valorisation de déchets	
Tri des déchets ménagers de la base vie	✗	CR2 : Mettre en place des poubelles de tri dans la base vie. Océlian : en attente de signalétique	
Interdiction de brûlage/ abandon/ enfouissement des déchets	✓	CR1 : Aucun brûlage, abandon ou enfouissement de déchets	

TYPE DE CONTROLE	ÉTAT ✓/✗ /so	COMMENTAIRES	
POLLUTION : EAU, SOL, BRUIT, AIR			
Air			
Limitation des envois de poussières (Bâche, utilisation de système D'aspiration, etc.)	✓	CR2 : une bâche sur 2 installée	#5
Bruit			
Comportements et précautions appropriées pour limiter le bruit sur un site sensible	✓	CR1 : Extinction des engins en période de non-fonctionnement, ...	
Respect des périodes et horaires de Travaux	✓	CR1 : Heures de travail respectées	
Produits Dangereux			
Stockage des produits dangereux sur rétention et à l'abri des intempéries	SO	CR1 : A suivre	
Etiquetage des produits utilisés et respect des incompatibilités de stockage	✓	CR1 : OK	
Utilisation d'huile de décoffrage végétale avec un risque faible pour la santé et l'environnement (voir FIRC) - hors béton architectonique et sauf si conditions climatiques extrêmes	SO	CR2 : A vérifier pour les prochaines visites	
Kit antipollution disponible ET test réalisé pour s'assurer que l'usage est compris	✓	CR2 : Photo à prendre lors de la prochaine visite	
Installation du barrage flottant	✓	CR1 : Photo à prendre lors de la prochaine visite	
Installation des extincteurs	✓	CR1 : Extincteurs présents dans toutes les pièces de la base vie	#6
Vérification sur les volumes de produits dangereux stockés : la capacité des bacs de rétention doit être en accord	✓	CR1 : OK	
Rejets dans le milieu			

TYPE DE CONTROLE	ÉTAT ✓/✗ /so	COMMENTAIRES	
Absence de rejet polluant dans le milieu naturel	✓	CR1 : Pas de rejet dans l'eau de seine	#7
TURBIDITÉ			
Mesure de turbidité réalisée + niveau d'oxygène	✓	CR1 : Mesures faites. Rapports de mesures à transmettre toutes les deux semaines	
Résultat de mesure de turbidité conforme ?	✓	CR2 : premier jet de mesures conforme. Cf : 25-081_EXE_OCE_FC_603_0_Suivi de la qualité des eaux S45 25-081_EXE_OCE_FC_603_1_Suivi de la qualité des eaux S46	
Contrôle visuel de la turbidité lors du passage	✓	CR1 : Contrôle visuel > OK	
ÉNERGIE ET RESSOURCES			
Suivi et analyse des consommations d'eau	SO	CR1 : Actuellement, des sanitaires chimique portables sont à dispositions des compagnons du chantier	#8
Suivi et analyse des consommations d'électricité et de fioul	✓	CR2 : Actuellement, l'électricité est fournie par un générateur. La consommation de fioul est suivie sur le registre environnement	#9
Mise en place de bungalows économes en eau et énergie	✗	CR1 : Éclairage en tubes fluorescents, pas de grooms installés sur les portes des algécos, et pas de contact de feuillure.	
BIODIVERSITÉ			
Protection du milieu naturel et de la biodiversité (arbres, cours d'eau, espèces)	✓	CR1 : Aucun rejet dans l'eau de seine et respect des prescriptions de l'écologie	#7
Identification des impacts environnementaux et des situations d'urgence en chantier (Analyse environnementale) et plan d'action associé	✓	CR1 : PAQE fourni	

TYPE DE CONTROLE	ÉTAT ✓/✗ /so	COMMENTAIRES	
NATURE DE L'ACTIVITÉ			
Les exigences locales applicables ont été identifiées	✓	CR1 : Respect des instructions de la DRIEAT	
Si activités concernées par la Loi sur l'eau : autorisation ou déclaration demandée et obtenue	✓	CR1 : Activité concernée par la loi sur l'eau > HAROPA port détient d'une autorisation pour toutes ces activités	

	REPORTAGE PHOTOS	
N°	Sujet	Photo(s)
1	Etat des palissades	
2	Etat et propreté des voiries	

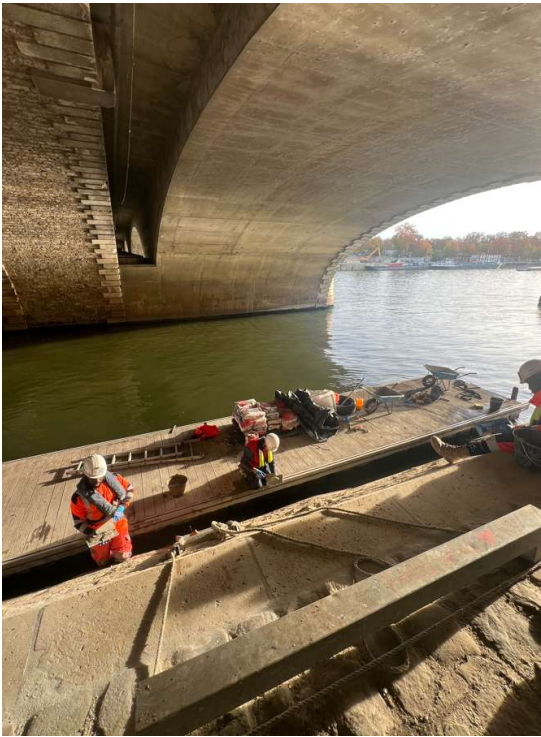	REPORTAGE PHOTOS	
3	Etat et propreté du chantier	
4	Identification des Bennes	


		REPORTAGE PHOTOS	
5	Bâche benne DIB		
6	Extincteurs		



REPORTAGE PHOTOS

7

Pas de rejet
dans l'eau

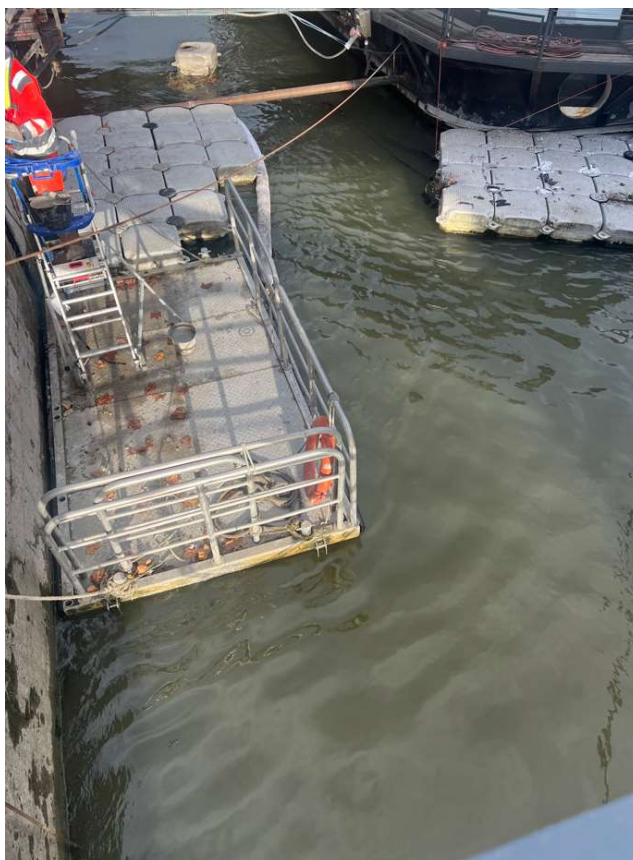

8

Toilettes
portables





REPORTAGE PHOTOS

9

Générateur
d'électricité

